Nr.	BKP	Vorgangsname	Dauer
1		Start Bauarbeiten	1 Tag
2		Rodungen	8 Tage
3		Trottoir Absenken bei Bushaltestelle	5 Tage
4		Schadstoffsanierung	5 Tage
5		Demontagen und Abbrüche	10 Tage
6		Spundwände	10 Tage
7		Aushubarbeiten	20 Tage
8	211	**Baumeisterarbeiten**	**288 Tage**
9		Bauplatzinstallation	5 Tage
10		Kanalisationsanschluss	5 Tage
11		Kanalisation - Erdregister	5 Tage
12		Bodenplatte	7 Tage
13		Wände UG	13 Tage
14		Decke UG TG	12 Tage
15		Hinterfüllen UG EG	5 Tage
16		Wände EG	8 Tage
17		Decke EG	8 Tage
18		Wände 1. OG	8 Tage
19		Decke 1. OG	8 Tage
20		Wände 2. OG	8 Tage
21		Decke 2. OG	8 Tage
22		Wände 3. OG	7 Tage
23		Decke 3. OG	8 Tage
24		Aussparungen schliessen	15 Tage
25		Demontage Kranen	2 Tage
26		Abgerüsten	2 Tage
27		**Rohbau fertig**	**0 Tage**
28	214	**Montagebau in Holz**	**5 Tage**
29		Trennwände Keller	5 Tage
30	221	**Fenster und Aussentüren**	**52 Tage**
31		Fenster-Montage	10 Tage
32		Haustüre	2 Tage
33		Erker - Montage	10 Tage
34		Oblicht	2 Tage
35	222	**Spenglerarbeiten**	**155 Tage**
36		Abläufe Terrasse	2 Tage
37		Spenglerarbeiten Dachrand	5 Tage
38		Spenglerarbeiten Fallrohre	2 Tage
39	224.2	**Flachdach**	**55 Tage**
40		Dampfsperre Dach	5 Tage
41		prov. Abdichtung Terrasse Attika	5 Tage
42		Hauptdach Sarnafil	15 Tage
43		Attika Schwarzdach	10 Tage
44		Nutzschicht - Gehbelag	5 Tage
45		Anschlüsse Fenster Balkone	5 Tage
46		Fertigstellung Flachdach	10 Tage
47	226.2	**Aussendämmung**	**46 Tage**
48		Platten kleben	10 Tage
49		Einbettung	10 Tage
50		Deckputz	5 Tage
51		1. Anstrich	3 Tage
52		2. Anstrich	2 Tage
53	225	**Spez. Dichtugen**	**32 Tage**
54		Schächte ausblasen	5 Tage
55		Fugen	2 Tage
56	228	**Sonnenschutz**	**27 Tage**
57		Bestellen Sonnenschutz	2 Tage
58		Montieren Sonnenschutz	5 Tage
59	23	**Elektroinstallationen**	**291 Tage**
60		Einlagen Boden, Wände, Decken	83 Tage
61		Rohinstallation	40 Tage
62		Tableau montieren	5 Tage
63		Fertigmontage Elektro	10 Tage
64		IBS und Test	10 Tage
65	24	**Heizungsinstallationen**	**291 Tage**
66		Einlagen Boden, Wände, Decken	83 Tage
67		Rohinstallation	40 Tage
68		Bodenheizung	5 Tage
69		Heizen	40 Tage
70		Heizkörper Fertigmontage	5 Tage
71		Fertigstellung Heizung	10 Tage
72		<IBS und Test	10 Tage
73	244	**Lüftungsinstallationen**	**291 Tage**
74		Einlagen Decken	83 Tage
75		Rohinstallation, Schächte	40 Tage
76		Fertigmontage Lüftung	10 Tage
77		IBS und Test	10 Tage
78	247	**Kaminanlagen**	**47 Tage**
79		Deckeneinlage liefern	2 Tage

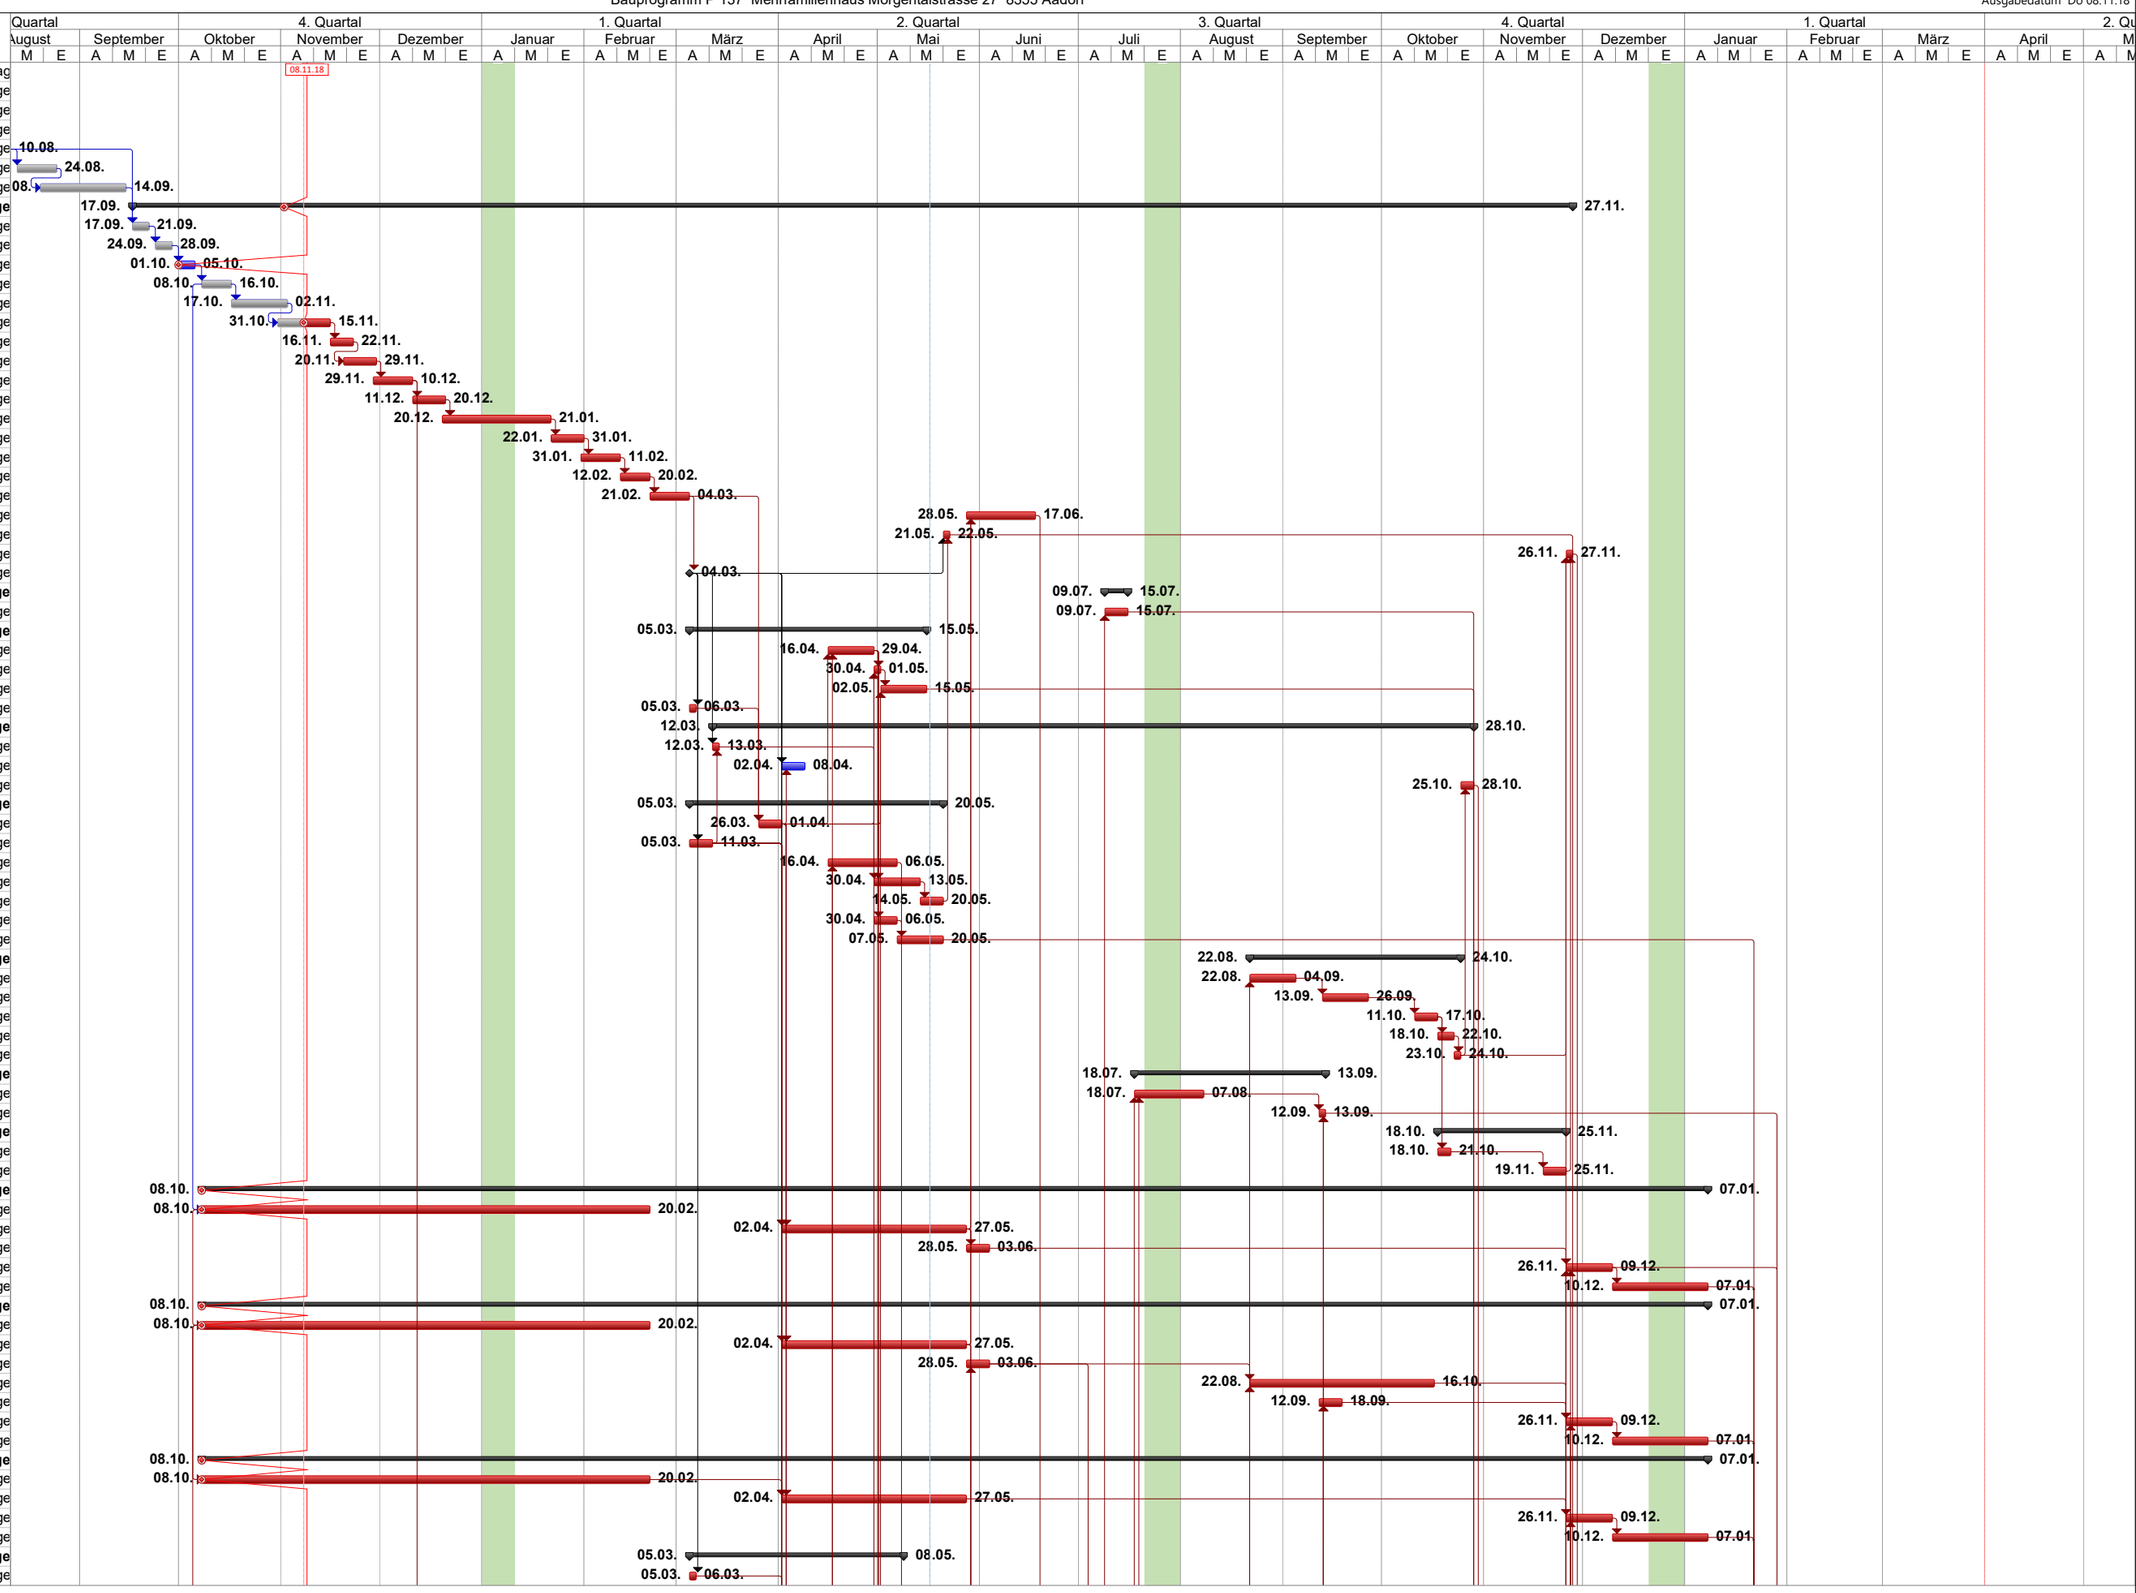
Quartal
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
M E A M E A M E A

Nr.	BKP	Vorgangsname	Dauer
80		Kamin montieren	2 Tage
81		Mantel montieren	2 Tage
82	**250**	**Sanitäre Installationen**	**301 Tage**
83		Einlagen Decke	83 Tage
84		Rohinstallation	40 Tage
85		Duschen vor UB	2 Tage
86		Badw./Duschen nach UB	5 Tage
87		Apparatemontage	5 Tage
88		Fertigstellung Sanitär	10 Tage
89		IBS und Test	10 Tage
90	**258**	**Küche**	**130 Tage**
91		Bestellung Küche	40 Tage
92		Montage Küche	10 Tage
93		Fertigstellung Küche	5 Tage
94		IBS und Test	10 Tage
95	**261**	**Aufzüge**	**141 Tage**
96		Bestellung Aufzüge	40 Tage
97		Montage Aufzüge	20 Tage
98		IBS und Test	10 Tage
99	**271**	**Gipserarbeiten**	**92 Tage**
100		Grundputz Wände	20 Tage
101		Weissputz Decken	20 Tage
102		Verkleidung Sanvortec	5 Tage
103		Deckputz	10 Tage
104		Deckputz Nasszellen	5 Tage
105	**272**	**Schlosserarbeiten**	**38 Tage**
106		Befestigungen, Rinnen	3 Tage
107		Dachrand	10 Tage
108		Geländer	10 Tage
109	**273**	**Schreiner**	**120 Tage**
110		Türrahmen Wohnungstüre	5 Tage
111		Türrahmen Innentüren	5 Tage
112		Badzimmermöbel	5 Tage
113		Türblätter, Innenausbau	5 Tage
114		Türen Keller	5 Tage
115		Schliessanlage	5 Tage
116	**281.0**	**Unterlagsböden**	**54 Tage**
117		Unterlagsböden Wohnungen	10 Tage
118		Ueberzug Keller	5 Tage
119		Hartbeton Garage	5 Tage
120		Ueberzug Balkon	5 Tage
121	**281**	**Bodenbeläge**	**15 Tage**
122		Parkettbeläge	15 Tage
123	**272**	**Plattenarbeiten**	**90 Tage**
124		Platten Böden	15 Tage
125		Platten Wände	15 Tage
126		Cheminée	2 Tage
127	**285**	**Malerarbeiten**	**120 Tage**
128		Maler Keller Wände und Decken	10 Tage
129		Maler Innen	20 Tage
130		Maler Nasszellen	5 Tage
131		Fertigstellung Maler	10 Tage
132	**421**	**Umgebung**	**20 Tage**
133		**Abnahme - Bezug**	**60 Tage**
134		Abnahmen	5 Tage
135		Mängelbehebung	30 Tage
136		Baureinigung	10 Tage
137		Uebergabe	5 Tage
138		Bezug	5 Tage
139		Ziel Bezug noch nicht definiert	0 Tage
140			
141		geplantes Ende	0 Tage
