p_175_bauprogramm_efh_leodolter
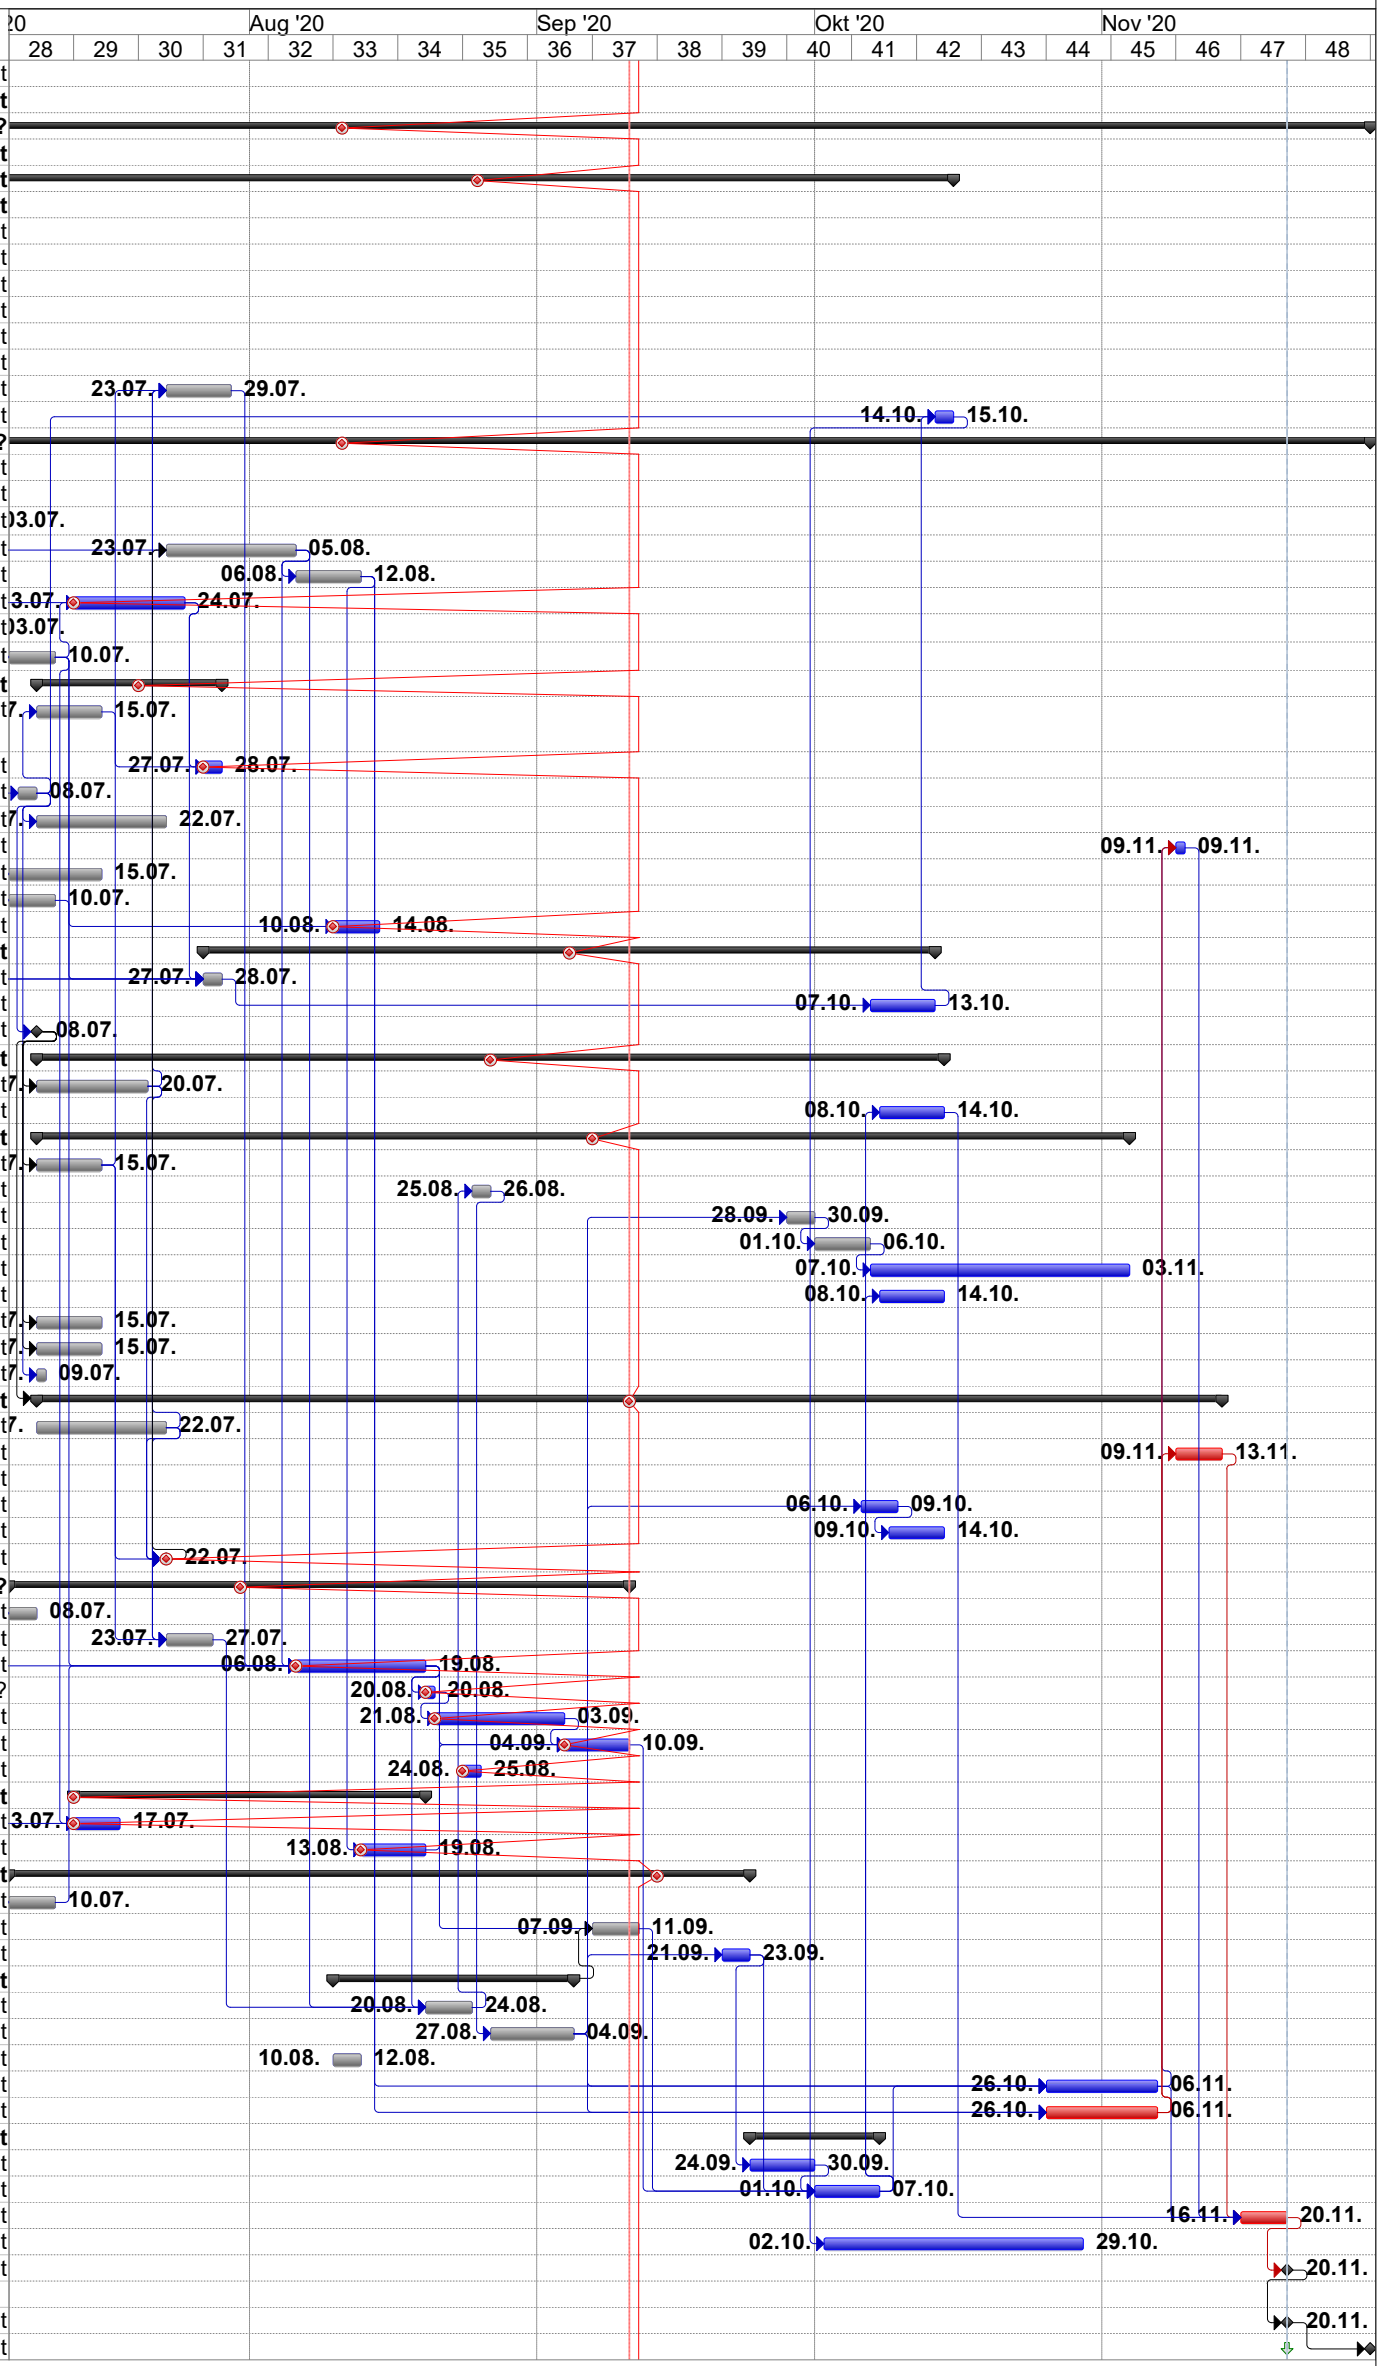
Nr.		Vorgangsname	Wer	Zeit
1	✓	Start		0 t
2	✓	**erledigt**		**261 t**
37		**Bauausführung**		**208 t?**
38	✓	**erledigt**		**30 t**
42		**Baumeister**	**211**	**147 t**
43	✓	**erledigt**		**32 t**
49	✓	Decke UG		10 t
50	✓	Abdichtungen Baumeister		2 t
51	✓	XPS Platten anbrigen		5 t
52	✓	hinterfüllen		5 t
53	✓	Gerüst		5 t
54	✓	Überzug Heizung/Technik		5 t
55	✓	Zumauern Innen		5 t
56		abgerüsten		2 t
57		**Zimmermann**	**214**	**195 t?**
58	✓	Planung Elemente		30 t
59	✓	Produktion Elemente		30 t
60	✓	Aufrichten Holzhaus		5 t
61	✓	Innere Verkleidungen		10 t
62	✓	Holztreppen		5 t
63		Eternitverkleidung		10 t
64	✓	Fenster Holzmetall	221	5 t
65	✓	Fenster Kunststoff	221	5 t
66		**Spengler**	**222**	**14 t**
67	✓	Dachrand, Dachfenster, Kamineinfassung		5 t
68		Fallrohre		2 t
69	✓	Bauabdichtung Flachdach	224	2 t
70	✓	Flachdacharbeiten		10 t
71		Spez. Isol - Kittfugen	225.0	1 t
72	✓	Aussendämmung Sockel	226	8 t
73	✓	Stahltreppe messen		5 t
74		Stahltreppe montieren		5 t
75		**Sonnensch.**	**228**	**57 t**
76	✓	Messen		2 t
77		Montieren		5 t
78	✓	Start Installationen		0 t
79		**Elektroinstallationen**	**Flach**	**70 t**
80	✓	Rohinstallation Elektro EG/OG		8 t
81		Fertigmontag Elektro		5 t
82		**Heizungsinstallationen**	**24**	**84 t**
83	✓	Rohinstallation Heizung EG/OG		5 t
84	✓	Bodenheizung		2 t
85	✓	Prov. Heizung 25°		3 t
86	✓	max Vorlauftemperatur System		4 t
87		heizen zum Trocknen		20 t
88		Fertigmontage Heizung		5 t
89	✓	Lüftungsinstallationen	244	5 t
90	✓	Zentrale Staubsaugeranlage		5 t
91	✓	Stahlkamin	247	1 t
92		**Sanitäre Installationen**	**25**	**92 t**
93	✓	Rohinstallation Sanitär EG/OG		10 t
94		Fertigmontage Sanitär		5 t
95	✓	Regenwassertank verlegen		5 t
96		Küche	258	4 t
97		Hauswirtschaftsraum		4 t
98		Rohinstallation beendet		0 t
99		**Gipser**	**271**	**49 t?**
100	✓	Schachtwand stellen		3 t
101	✓	Schachtwand schliessen		3 t
102		Weissputz Fermacellwände		10 t
103		abgehängte Decken rosten		1 t?
104		abgehängte Decken rosten		10 t
105		Deckputz		5 t
106		Norm-Metallteile	272.1	2 t
107		**Schlosserarbeiten**	**272.2**	**28 t**
108		Geländer Fenster+Balkone		5 t
109		Geländer Innen		5 t
110		**Schreinerarbeiten**	**273**	**58 t**
111	✓	Haustüre		5 t
112	✓	Wandschränke		5 t
113		Holztüren		3 t
114	✓	**Unterlagsböden**	**281.0**	**20 t**
115	✓	Dämmen		3 t
116	✓	Unterlagsböden Anhydrit		7 t
117	✓	Hartbeton		3 t
118		Parkett . Teppich	281.2	10 t
119		Plattenbeläge	282	10 t
120		**Maler**	**285**	**10 t**
121		Türen und Schränke streichen		5 t
122		Wände streichen		5 t
123		Baureinigung	287	5 t
124		Umgebungsarbeiten	461	20 t
125		Fertigstellung		0 t
126				
127		Uebergabe nach Bauprogramm		0 t
128		geplante Übergabe		0 t
